
KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 19/2026

TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Ulkoseinäelementtien asennus
- Vesikattolohkojen asennus
- Ulkokatokset
- Maanrakennustöitä
- Sähkötyöt



TYÖMAAN RESURSSIT




- Työmaalla työskenteli kuluneella viikolla
 - 2 Työnjohtajaa Sakela Rakennus Oy
 - 9 RAM Sakela Rakennus Oy
 - 2 RAM Rakennus Tanska Oy
 - 1 Hiab nosturiauto Nosto ja Kuljetus Visuri Oy
 - 1 KKH28 + 1 RAM Vieskan Maarakennus Oy
 - 4 RAM Vieskan Elementti Oy
-

KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

TR mittauksen tulokset 4.5.2026

96,4 %

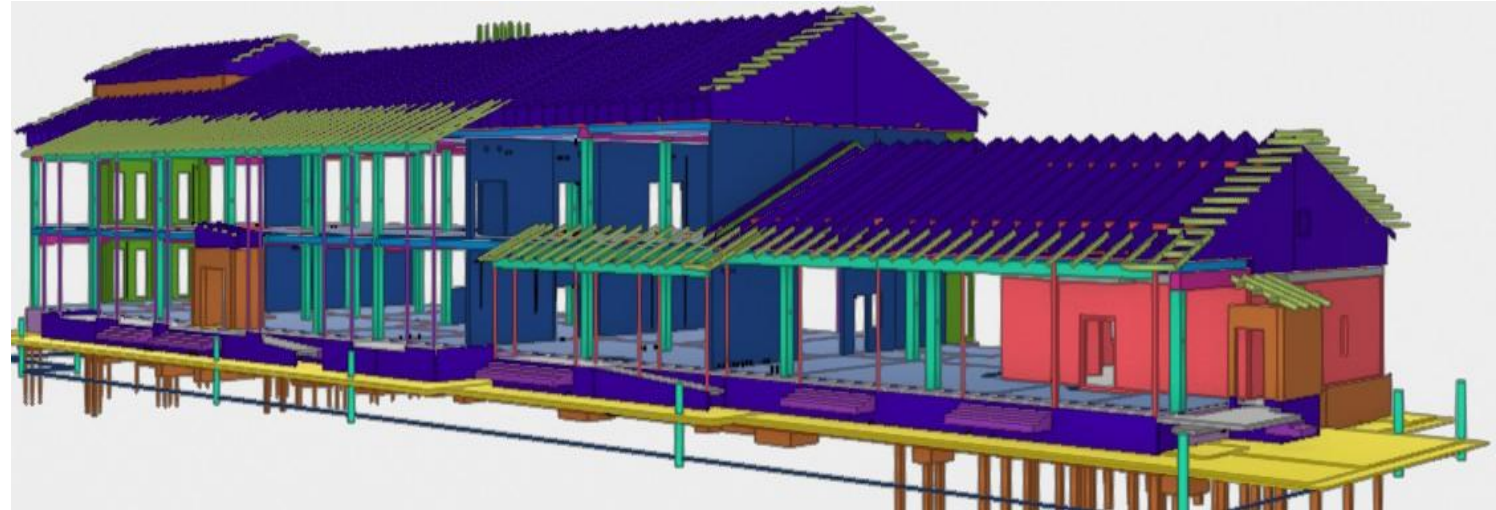

Rakentavin terveisin

Työpäällikkö Kalle Kinnunen, 050 421 1324, kalle.kinnunen@sakela.fi

Työnjohtaja Ossi Pokela, 044 783 3915 ossi.pokela@sakela.fi

Työnjohtaja / VTJ Heikki Rissanen, 050 494 5514 heikki.rissanen@sakela.fi

TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- Puuseinäelementtien saumojen paneloinnit
- Kattolohkojen asentamien ja Vesikaton muut puutyöt
- Maanrakennustyöt
- Sisään käynnin luiskat ja tasanteet
- Pintalattia töiden valmistelut alkavat
- IV ja PU työt alkavat



KUVIA TYÖMAALTA

Seinä elementtiasennukset pääosin valmiina



Kattolohkojen asennus aloitettu myös yläkatolle
ja IV-konehuoneen elementit asennettu



Ulkokatosten teko myös käynnistynyt

